

● 東北の元気、日本の元気を青森から

平成 28 年度復興施策シート

八戸市復興計画推進市民委員会

3. 都市基盤の再建

八 戸 市

平成 28 年 7 月 29 日

○復興施策シート目次

3. 都市基盤の再建

(1) 市街地の整備	1
(2) 湾港の整備	8
(3) 海岸・河川の整備	13
(4) 道路・公園・下水道等の整備	16
(5) 公共交通の維持・確保	21

○施策シートの見方

・目指す姿：

復興計画の「第2 施策の基本方向」に基づき、当該項目について、特定の時点を定めず、将来的に「このようになっていたらよい」という姿を掲載しています。

・市民アンケートにおける現状評価：

平成28年1～2月に実施した「市民アンケート」における各施策についての現状評価を点数化し、掲載しています（「十分満たされている」を4点、「まあまあ満たされている」を3点、「あまり満たされていない」を2点、「ほとんど満たされていない」を1点とし、当該回答者数（「判断できない」を除く。）で割った平均値で、4点満点。）。

平成28年市民アンケート調査結果報告書を参照してください。

・施策の工程：

復興計画における当該施策の内容毎の工程表を掲載しています。

・参考指標：

当該施策の動向を把握するのに参考となる指標を掲載しています。

※この指標をもって当該施策の達成度を測るものではありません。

・主要事業：

当該施策を構成している、創造的復興プロジェクト等の主要な事業です。

【実施状況】は平成27年度（又は27年度迄）の実施状況、【今後の予定】は平成28年度以降の実施状況及び予定を記載しています。事業名に◆がついている事業は、創造的復興プロジェクト事業です。また、★印がついている事業は、八戸市総合計画の戦略プロジェクトにも位置づけられている事業です。さらに、事業名の隣に次の事業区分を記載しています。

完了…平成27年度に完了した事業

追加…策定時の復興計画に未掲載で、今回追加した事業

・事業費：

各事業について、平成27年度の決算（見込）額、平成28年度の予算額を可能な範囲で記載しています。なお、決算（見込）額及び予算額には、繰越事業費分を含み、事業費には、人件費（事業費支弁以外）を含みません。

・施策を取り巻く課題や論点：

意見を頂くための行政側からとらえた課題や論点です。意見を述べるにあたっての参考としてください。

1. 施策情報

基本方向	3. 都市基盤の再建																																																																						
施策名	3-(1) 市街地の整備																																																																						
施策の概要	<p>目指す姿</p> <p>最低限市民の生命が守られるよう、被害をできるだけ最小にする「減災」の視点に立ち、ハード・ソフト両面から震災対策が行き届いた市街地が整備されている。</p> <p>市民アンケートにおける現状評価</p> <p>【設問】公共施設の改修・改築や民間建築物の耐震化支援等により、市内における建物の安全性が確保されている。</p> <p>【点数】2.5</p> <p>施策の工程</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr style="background-color: #fff9c4;"> <th colspan="2">復旧期</th> <th colspan="4">再生期</th> <th colspan="4">創造期</th> </tr> <tr> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> <tr> <td colspan="10">① 災害に強い市街地の整備</td> </tr> <tr> <td colspan="10">② 津波被災地域の再建方策の検討</td> </tr> <tr> <td colspan="10">③ 建物の耐震化の促進</td> </tr> <tr> <td colspan="10">④ 災害時の交通の円滑化に資する広域幹的な道路ネットワークの整備</td> </tr> </table> <p>参考指標の動向</p> <p>○復興道路</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>計画延長</th> <th>利用中</th> <th>事業中</th> <th>うち、事業中-0/2段階</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三陸沿岸道路</td> <td>359km</td> <td>158 km</td> <td>201 km</td> <td>148 km</td> </tr> </tbody> </table> <p>(国土交通省東北地方整備局 HP より)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>八戸・久慈自動車道</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 八戸南環状道路 (H26. 3. 29 開通) ② 八戸南道路 (H25. 3. 9 開通) ③ 洋野階上道路 (青森県) ④ 洋野階上道路 (岩手県) ⑤ 久慈北道路 <p>三陸北縦貫道路</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑥ 野田久慈道路 ⑦ 普代道路 (H25. 10. 13 開通) ⑧ 尾肝要普代道路 ⑨ 尾肝要道路 (H26. 3. 2 開通) ⑩ 田野畑道路 ⑪ 田老岩泉道路 <p>三陸縦貫自動車道</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑫ 宮古老道路 ⑬ 山田宮古道路 ⑭ 釜石山田道路 ⑮ 吉浜釜石道路 ⑯ 吉浜道路 (H27. 11. 29 開通) ⑰ 高田道路 (H26. 3. 23 開通) ⑱ 唐桑高田道路 (岩手県) ⑲ 唐桑高田道路 (宮城県) ⑳ 気仙沼道路 ㉑ 本吉気仙沼道路 ㉒ 本吉気仙沼道路 (Ⅱ期) ㉓ 歌津本吉道路 ㉔ 南三陸道路 ㉕ 登米志津川道路 (H28. 4. 16 一部開通) ㉖ 矢本石巻道路 (鳴瀬奥松島～石巻河南) ㉗ 矢本石巻道路 (石巻河南～桃生豊里) ㉘ 仙塩道路 (H28. 3. 27 開通) <p>※ は、震災後新規区間</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>三陸沿岸道路 359 km (事業中 H23 新規区間 148 km)</p> <p>三陸北縦貫道路</p> <p>三陸縦貫自動車道</p> </div> </div>	復旧期		再生期				創造期				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	① 災害に強い市街地の整備										② 津波被災地域の再建方策の検討										③ 建物の耐震化の促進										④ 災害時の交通の円滑化に資する広域幹的な道路ネットワークの整備										路線名	計画延長	利用中	事業中	うち、事業中-0/2段階	三陸沿岸道路	359km	158 km	201 km	148 km
復旧期		再生期				創造期																																																																	
H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																														
① 災害に強い市街地の整備																																																																							
② 津波被災地域の再建方策の検討																																																																							
③ 建物の耐震化の促進																																																																							
④ 災害時の交通の円滑化に資する広域幹的な道路ネットワークの整備																																																																							
路線名	計画延長	利用中	事業中	うち、事業中-0/2段階																																																																			
三陸沿岸道路	359km	158 km	201 km	148 km																																																																			

凡例

事業 No.	復興計画の事業名	事業区分 (完了・追加)	<事業主体>	事業費	
				H27 決算	千円
				H28 予算	千円
【事業概要】		【実施状況】		【今後の予定】	
		H27 年度(又は H27 年度迄)の状況		H28 年度以降の状況・予定	

2. 施策を構成する主要事業（創造的復興プロジェクト事業等）

①災害に強い市街地の整備

No.01	津波被災市街地の状況調査	H23 完了
-------	--------------	--------

No.02	復興まちづくり構想素案策定に関する調査(再掲)	H23 完了
-------	-------------------------	--------

②津波被災地域の再建方策の検討

No.03	復興まちづくり構想素案策定に関する調査(再掲)	H23 完了
-------	-------------------------	--------

事業 No.	◆★災害に強い地域コミュニティ づくりの推進(再掲)	完了	<事業主体> 市・民	事業費	
				H27 決算	1,491 千円
				H28 予算	一千円
【事業概要】		【実施状況】		【今後の予定】	
「災害に強い地域づくり会議」の開催を始めとする住民主体の地域づくり活動への支援、災害に強い地域コミュニティ計画策定への支援及び「元気な八戸づくり」市民奨励金の交付(災害に強い地域づくり応援コース)		◎「元気な八戸づくり」市民奨励金(災害に強い地域づくり応援コース)の交付 H27 年度実績 交付件数 6 件 交付額 1,491,000 円 <奨励金概要> 災害に強い地域づくりを目的として地域住民が主体的に行う活動のうち、新たに取り組むもの又は従来取り組んでいた活動を拡充して実施するものが対象。1 件につき 30 万円上限(補助率 100%)。 ※H27 年度で終了		—	

③建物の耐震化の促進

No.05	◆★学校施設の耐震化	H24 完了
-------	------------	--------

No.06	青森県安全安心住宅リフォーム促進事業(再掲)	H23 完了
-------	------------------------	--------

No.07	木造住宅耐震診断支援事業	<事業主体> 市	事業費	H27 決算 550 千円 H28 予算 2,200 千円
【事業概要】	【実施状況】	【今後の予定】		
S56年5月以前に建築された旧耐震基準木造住宅の耐震診断を支援	旧耐震基準の木造住宅のうち、S56.6以降に増改築されていないもの等、一定条件を満たす木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合に専門知識を有する耐震診断員を派遣し耐震診断を行う。 <診断件数> H27年度実績 5戸 (H19年度～合計105戸)	H28年度 20戸募集		

No.08	安全安心住宅リフォーム促進事業(再掲)	H25完了
-------	---------------------	--------------

No.09	耐震診断義務化建築物耐震診断支援事業 完了	<事業主体> 市	事業費	H27 決算 18,542 千円 H28 予算 ー千円
【事業概要】	【実施状況】	【今後の予定】		
改正耐震改修促進法の施行により、耐震診断が義務付けられた大規模建築物について、耐震診断費用の一部を補助	<制度内容> ・H25.11.25に改正耐震改修促進法が施行され、不特定多数の者が利用する大規模建築物に耐震診断が義務化されたことから、所有者が耐震診断を実施する場合に、診断費用の一部について補助するもの。 ・現地調査等の実施により対象物件を把握 <対象> 7件 <H26年度実施> 3件 <H27年度実施> 2件 ※残りの2件については、規模縮小等により耐震診断義務化の対象外となった。	—		
No.10	木造住宅耐震改修支援事業	<事業主体> 市	事業費	H27 決算 0 千円 H28 予算 900 千円
【事業概要】	【実施状況】	【今後の予定】		
木造住宅耐震診断支援事業による耐震診断の結果、耐震性が低いと診断された木造住宅について、耐震改修工事費用の一部を補助	<制度内容> H24年度より「八戸市安全安心リフォーム促進事業」の補助項目の1つとして実施してきたが、当該事業がH25年度で終了したことから、引き続き、当該制度の補助額を拡充し耐震改修工事費の一部について補助するもの。 <H27年度実績> 0件	H28年度 1戸募集		

No.11	耐震対策緊急促進事業	＜事業主体＞ 市	事業費	H27 決算 H28 予算	0 千円 197,616 千円
【事業概要】 改正耐震改修促進法の施行により、耐震診断が義務付けられた大規模建築物について、耐震改修計画策定費用、耐震改修工事費用の一部を補助		【実施状況】 ＜制度内容＞ ・不特定多数の者が利用する大規模建築物の所有者が耐震改修を実施する場合に、耐震改修計画策定費用、耐震改修工事費用の一部について補助するもの。 ＜H27 年度実績＞ ・耐震改修計画策定費用の補助 5 件 (H28 年度へ事業繰越)		【今後の予定】 H28 年度 耐震改修工事費用の補助 2 件募集	

④広域的な道路ネットワークの整備

No.12	◆高規格幹線道路の整備	<事業主体> 国	事業費	H27 決算 H28 予算	一千円 一千円
<p>【事業概要】 上北自動車道の整備（上北道路、上北天間林道路、天間林道路）及び八戸・久慈自動車道の整備（八戸南環状道路、八戸南道路、洋野階上道路、久慈北道路）</p>	<p>【実施状況】</p> <p>◎上北自動車道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上北道路（L=7.7 km） H17 年度 事業着手 H24 年度 用地買収、改良工事等 H25.3 供用開始（暫定2車線） ・上北天間林道路（L=7.8 km） H20 年度 事業着手 H24 年度 設計、用地買収、改良工事 H25 年度 用地買収、改良工事、橋梁工事等 H26 年度 調査設計、用地買収、補償、改良工事等 H27 年度 調査設計、用地買収、改良・橋梁工事 ・天間林道路（L=8.3 km） H24 年度 事業着手 H25 年度 調査設計、用地買収等 H26 年度 調査設計、用地買収、補償、改良工事等 H27 年度 調査設計、用地買収、改良・橋梁工事 <p>◎八戸・久慈自動車道</p> <ul style="list-style-type: none"> ・八戸南環状道路（L=8.6 km） H3 年度 事業着手 H17.3 一部区間供用開始（L=3.8 km） H26.3 全線供用開始（2車線） ・八戸南道路（L=8.7 km） H7 年度 事業着手 H19.6 一部区間供用開始（L=3.4 km） H24 年度 設計、用地買収、改良工事等 H25.3 全線供用開始（暫定2車線） ・洋野階上道路（L=23 km） H23 年度 事業着手 H24 年度 調査、設計、用地買収等 H25 年度 調査、設計、用地買収、橋梁工事等 H26 年度 調査設計、用地買収、補償、改良工事等 H27 年度 調査設計、用地買収、改良・橋梁工事 ・久慈北道路（L=7.4 km） H21.3 事業着手 H24 年度 設計、用地買収、橋梁工事等 H25 年度 調査、設計、用地買収、橋梁工事等 H26 年度 調査、設計、用地買収、橋梁工事等 H27 年度 調査設計、用地買収、橋梁工事等 	<p>【今後の予定】</p> <p>◎上北自動車道 調査設計、用地買収、改良・橋梁工事</p> <p>◎八戸・久慈自動車道 調査設計、用地買収、改良・橋梁工事</p>			

No.13	都市計画道路の整備	<事業主体> 県	事業費	H27 決算 H28 予算	一千円 一千円
<p>【事業概要】 都市計画道路 3・5・1 号沼館三日町線の整備及び都市計画道路 3・3・8 号白銀市川環状線（主要地方道八戸環状線）（桔梗野工区、天久岱工区、尻内工区、糠塚工区、中居林工区）の整備</p>	<p>【実施状況】 ◎3・5・1 沼館三日町線 ・内丸 (L=0.68 km) H22 年度 事業着手 H24 年度 調査、用地買収、補償 H25 年度 用地買収、補償 H26 年度 用地買収、補償 H27 年度 用地買収、補償、埋蔵文化財発掘調査 ◎3・3・8 白銀市川環状線（主要地方道八戸環状線） ・桔梗野工区 (L=2.73 km) H7 年度 事業着手 H17.12 一部区間供用開始 (L=約 1.0 km) H24 年度 橋梁上部工、道路改良工、舗装工 H25 年度 道路改良工、舗装工 H25.12 供用開始 ・中居林工区 (L=0.60 km) H16 年度 事業着手 H24 年度 用地買収、補償、道路改良工 H25 年度 用地買収、補償、道路改良工、舗装工 H26 年度 道路改良工、用地買収、補償 H27.3 供用開始 ・糠塚工区 (L=1.95 km) H9 年度 事業着手 H24 年度 道路改良工、舗装工 H26.3 供用開始 ・天久岱工区 (L=3.5 km) H25 年度 事業着手 H26 年度 構造物設計等、用地買収、補償、道路改良工 H27 年度 構造物設計等、用地買収、補償、道路改良工 ・尻内工区 (L=1.35 km) H26 年度 事業着手、測量、道路橋梁設計 H27 年度 測量、道路橋梁設計</p>	<p>【今後の予定】 ◎3・5・1 沼館三日町線 H28 年度 用地買収、補償、埋蔵文化財発掘調査、工事 ◎3・3・8 白銀市川環状線（主要地方道八戸環状線） ・天久岱工区 H28 年度 用地買収、補償、道路改良工 ・尻内工区 H28 年度 用地買収、補償、橋梁下部工</p>			

No.14	◆主要道路の整備	＜事業主体＞ 県	事業費	H27 決算	一千円
				H28 予算	一千円
【事業概要】 国道 454 号(正法寺Ⅱ期工区)の整備	【実施状況】 ・正法寺Ⅱ期工区 (L=0.64 km) H22 年度 事業着手 H24 年度 用地測量・調査 揚水機場移設調査設計 H25 年度 用地買収、補償 H26 年度 道路改良・舗装工事、用地買収、補償 H27 年度 用地買収、補償、道路改良工	【今後の予定】 ・正法寺Ⅱ期工区 H28 年度 用地買収、補償、道路改良工			

3. 施策を取り巻く課題や論点

◎最大クラスの津波に対応できるハード・ソフト両面からの災害に強い市街地の検討 ◎国・県による広域的な道路ネットワークの早期整備
--

4. 復興計画推進市民委員会意見

施策を取り巻く課題や論点に対する意見
その他自由意見

1. 施策情報

基本方向	3. 都市基盤の再建																																																																						
施策名	3-(2) 湾港の整備																																																																						
施策の概要	<p>目指す姿</p> <p>北東北の地域経済を支える国際物流拠点港として、八戸港の整備促進や防災力の強化が図られている。</p> <p>市民アンケートにおける現状評価</p> <p>【設問】防潮堤や堤防の整備等により、臨海部や河川における津波対策の強化が図られている。</p> <p>【点数】 2.7</p> <p>施策の工程</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr style="background-color: #fff9c4;"> <th colspan="3">復旧期</th> <th colspan="3">再生期</th> <th colspan="5">創造期</th> </tr> <tr> <th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>H31</th><th>H32</th><th></th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="background-color: #e0f7fa;">① 港湾施設の早期復旧</td> <td colspan="9"></td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="background-color: #e0f7fa;">② 北東北の国際物流拠点港としての八戸港の整備促進と防災力の強化</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="background-color: #e0f7fa;">③ 国際コンテナ定期航路等の航路の早期再開と拡充</td> </tr> </table>	復旧期			再生期			創造期					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32		① 港湾施設の早期復旧												② 北東北の国際物流拠点港としての八戸港の整備促進と防災力の強化											③ 国際コンテナ定期航路等の航路の早期再開と拡充																								
復旧期			再生期			創造期																																																																	
H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																														
① 港湾施設の早期復旧																																																																							
② 北東北の国際物流拠点港としての八戸港の整備促進と防災力の強化																																																																							
③ 国際コンテナ定期航路等の航路の早期再開と拡充																																																																							
参考指標の動向	<p style="text-align: center;">八戸港コンテナ貨物取扱量</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>数量(TEU)</th> <th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--○-- H22年</td> <td>3,486</td><td>2,617</td><td>4,197</td><td>4,525</td><td>4,160</td><td>4,072</td><td>3,931</td><td>4,192</td><td>3,228</td><td>3,717</td><td>3,767</td><td>3,538</td><td>45,430</td> </tr> <tr> <td>—■— H23年</td> <td>3,588</td><td>3,358</td><td>1,407</td><td>184</td><td>1,022</td><td>1,550</td><td>2,528</td><td>3,049</td><td>3,029</td><td>4,760</td><td>3,009</td><td>3,362</td><td>30,846</td> </tr> <tr> <td>—▲— H24年</td> <td>3,039</td><td>4,117</td><td>4,694</td><td>3,260</td><td>4,260</td><td>3,138</td><td>3,286</td><td>3,494</td><td>2,964</td><td>4,264</td><td>2,897</td><td>3,450</td><td>42,863</td> </tr> <tr> <td>—◆— H27年</td> <td>4,163</td><td>4,085</td><td>4,347</td><td>5,754</td><td>5,447</td><td>4,801</td><td>5,322</td><td>4,147</td><td>5,083</td><td>5,253</td><td>5,167</td><td>4,496</td><td>58,065</td> </tr> </tbody> </table>	数量(TEU)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	--○-- H22年	3,486	2,617	4,197	4,525	4,160	4,072	3,931	4,192	3,228	3,717	3,767	3,538	45,430	—■— H23年	3,588	3,358	1,407	184	1,022	1,550	2,528	3,049	3,029	4,760	3,009	3,362	30,846	—▲— H24年	3,039	4,117	4,694	3,260	4,260	3,138	3,286	3,494	2,964	4,264	2,897	3,450	42,863	—◆— H27年	4,163	4,085	4,347	5,754	5,447	4,801	5,322	4,147	5,083	5,253	5,167	4,496	58,065
数量(TEU)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計																																																										
--○-- H22年	3,486	2,617	4,197	4,525	4,160	4,072	3,931	4,192	3,228	3,717	3,767	3,538	45,430																																																										
—■— H23年	3,588	3,358	1,407	184	1,022	1,550	2,528	3,049	3,029	4,760	3,009	3,362	30,846																																																										
—▲— H24年	3,039	4,117	4,694	3,260	4,260	3,138	3,286	3,494	2,964	4,264	2,897	3,450	42,863																																																										
—◆— H27年	4,163	4,085	4,347	5,754	5,447	4,801	5,322	4,147	5,083	5,253	5,167	4,496	58,065																																																										

2. 施策を構成する主要事業（創造的復興プロジェクト事業等）

① 湾港施設の早期復旧

No.01	八戸港復旧・復興指針の策定(再掲)	H23 完了
No.02	◆八太郎北防波堤等の復旧	H25 完了
No.03	◆航路・泊地の復旧	H25 完了
No.04	◆護岸、臨港道路、港湾緑地等の復旧	H24 完了
No.05	八戸臨海鉄道の運転再開	H23 完了
No.06	清掃船「清港丸」陸揚げ・解体	H23 完了

② 八戸湾の整備促進と防災力の強化

No.07	八戸港復旧・復興指針の策定(再掲)	H23 完了
-------	-------------------	--------

No.08	◆★八戸港の整備	<事業主体> 国・県	事業費	H27 決算 447,907千円
				H28 予算 479,588千円
【事業概要】	【実施状況】	【今後の予定】		
中央第1防波堤、中央第2防波堤、航路泊地並びに土砂処分場と河原木1号ふ頭(ポートアイランド)の整備、コンテナ貨物量の増加に対応した国際物流ターミナルの機能拡充	<p>国・県が実施する港湾施設の整備事業(防波堤整備、航路・泊地の浚渫、緑地整備等)に伴う負担金<H27年度末までの進捗率></p> <p>国直轄事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 中央第1防波堤: 2,300m / 2,320m (99%) 中央第2防波堤: 1,340m / 1,470m (91%) 航路・泊地整備、土砂処分場整備(市川、八太郎2号埠頭) <p>県事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 河原木地区沼館緑地 護岸工事・埋立 市川船だまり防砂堤 消波ブロック製作 八太郎1号埠頭嵩上げ工事 八太郎2号埠頭受変電棟津波対策 防水対策整備 八太郎2号埠頭コンテナヤード整備 調査・設計・舗装改良 第一工業港浚渫工事 	<p>国直轄事業: 中央第1防波堤、中央第2防波堤整備、航路・泊地整備、土砂処分場整備(市川、八太郎2号埠頭)</p> <p>県事業: 河原木地区沼館緑地 緑地整備、市川船だまり防砂堤消波ブロック据付、八太郎1号埠頭嵩上げ工事、八太郎2号埠頭受変電棟津波対策 防水対策整備、八太郎2号埠頭コンテナヤード整備 設計・用地買収・舗装改良、第一工業港浚渫工事</p>		

No.09	◆八戸港の防災機能の強化	<事業主体> 国・県	事業費	H27 決算 H28 予算	一千円 一千円
【事業概要】 漂流物防護柵の設置、防潮堤の整備、緑地の嵩上げ		【実施状況】 八戸港津波高潮対策：防潮堤整備 八太郎緩衝緑地嵩上げ：緑地嵩上げ工事 河原木地区漂流物対策：漂流物防護柵整備		【今後の予定】 事業継続実施	

③航路の早期再開と拡充

No.10	フェリーターミナル施設の復旧	H23 完了
-------	----------------	--------

No.11	フェリー航路の再開(再掲)	H23 完了
-------	---------------	--------

No.12	コンテナ航路の再開	H23 完了
-------	-----------	--------

No.13	◆コンテナターミナル施設(電源設備等)の復旧	H24 完了
-------	------------------------	--------

No.14	◆保安対策設備の復旧	H23 完了
-------	------------	--------

No.15	◆★【復興】ポートセールスの展開(再掲)	<事業主体> 市・民	事業費	H27 決算 H28 予算	9,143 千円 14,480 千円
【事業概要】 企業訪問などによるポートセールス活動の実施及び海外、首都圏、北東北におけるポートセミナーの開催などによる八戸港の利用の促進		【実施状況】 ◎海外ポートセールス H27.6 米国タコマ市・シアトル市へミッション団を派遣 ◎国内ポートセミナー H27.7 「八戸セミナー2015」を東京及び名古屋で開催(八戸港のPR)		【今後の予定】 事業継続実施 ◎海外ポートセールス H28.6 台湾・韓国へミッション団を派遣 ◎国内ポートセミナー H28.7 「八戸セミナー2016」を東京及び名古屋で開催 ◎「八戸港コンテナ定期航路開設促進事業費補助金」(船社向けインセンティブ)の創設	

No.16	◆★海外販路拡大事業(再掲)	<事業主体> 市・民	事業費	H27 決算 8,052 千円	H28 予算 11,373 千円
<p>【事業概要】 地場産品の販路拡大を図るため、海外展示会へのブース出展及びバイヤーとのマッチング支援の実施</p>	<p>【実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎展示会出展 H27.8 香港 Food Expo 2015 出展 ◎青森県産品フェアへの参加 H27.6 シアトル 青森フェア in 宇和島屋参加 H27.10 ロス・ハワイ AOMORI フェア参加、現地市場視察、企業訪問(商談) ◎青森県産品フェアの開催 H28.1 ベトナム Japan Aomori Food Fair 2016 出展 ◎海外への販売促進のための協力・支援 関係団体と連携・協力したセミナー等の開催 	<p>【今後の予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎在外公館でのプロモーション活動 ・H28.10 在ロサンゼルス日本国総領事館公邸にて、八戸の食材を使った料理を招待者に提供 ◎青森県産品フェアへの参加 ・H28.10 ロス AOMORI フェア ・H28.11 シアトル 青森フェア in 宇和島屋 ◎青森県産品フェアの開催 ・H29.1 ベトナム Japan Aomori Food Fair 2017 ◎海外への販売促進のための協力・支援 ・関係団体と連携・協力したセミナー等の開催 ◎海外販路拡大支援補助金の新設 			
No.17	◆★海外経済交流事業(再掲)	<事業主体> 県・市	事業費	H27 決算 2,086 千円	H28 予算 1,501 千円
<p>【事業概要】 アジア及び北米との貿易拡大を目指した経済交流の促進</p>	<p>【実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎姉妹港等との経済交流 ・タコマ港との経済貿易協定の更新 ・フィリピン・マニラ港(姉妹港)の現地情勢についての情報収集 ◎友好都市等との経済交流 ・中国天津市、蘭州市等の友好都市等との経済交流に係る情報収集 ◎八戸港情報誌による海外情報の提供 ◎八戸市海外経済協力員との交流、現地情報の提供 ・香港：新規協力員を委嘱(前任者からの引継) ・北米：新規協力員を委嘱 	<p>【今後の予定】 事業継続実施</p>			

3. 施策を取り巻く課題や論点

- ◎八戸港復旧・復興方針の着実な推進
- ◎海外との経済交流の促進と外貿コンテナ航路の維持・拡充
- ◎地域産業の国内外への販路拡大

4. 復興計画推進市民委員会意見

施策を取り巻く課題や論点に対する意見

その他自由意見

1. 施策情報

基本方向	3. 都市基盤の再建																																							
施策名	3 - (3) 海岸・河川の整備																																							
施策の概要	<p>目指す姿 市民の生命・財産を守るための海岸や河川の堤防等の復旧整備が進み、津波対策の強化が図られている。</p> <p>市民アンケートにおける現状評価 【設問】防潮堤や堤防の整備等により、臨海部や河川における津波対策の強化が図られている。 【点数】2.7</p> <p>施策の工程</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr style="background-color: #fff9c4;"> <th colspan="3">復旧期</th> <th colspan="3">再生期</th> <th colspan="3">創造期</th> </tr> <tr> <th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>H26</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>H31</th><th>H32</th> </tr> <tr> <td colspan="10">① 堤防、防潮堤、水門等の復旧整備による海岸の津波対策の推進</td> </tr> <tr> <td colspan="10">② 堤防等の復旧整備による河川の洪水、津波・高潮対策の推進</td> </tr> </table>	復旧期			再生期			創造期			H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	① 堤防、防潮堤、水門等の復旧整備による海岸の津波対策の推進										② 堤防等の復旧整備による河川の洪水、津波・高潮対策の推進									
復旧期			再生期			創造期																																		
H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																															
① 堤防、防潮堤、水門等の復旧整備による海岸の津波対策の推進																																								
② 堤防等の復旧整備による河川の洪水、津波・高潮対策の推進																																								
参考指標の動向	<p>○海岸対策の状況</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th>内容等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市川海岸 ※五戸川河口北側</td> <td>・五戸川河口北側の海岸堤防・離岸堤の災害復旧(H24.3完了)(県)</td> </tr> <tr> <td>八戸港海岸(八太郎地区) ※五戸川河口南側</td> <td>・五戸川河口南側の海岸堤防・陸間(こう)の整備(H25.9完成)(県)</td> </tr> <tr> <td>市川地区保安林 (飛砂防備保安林)</td> <td>・クロマツ苗木の植栽工、静砂工の実施(H28年度完了予定)(県)</td> </tr> </tbody> </table> <p>○河川対策の状況</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th>内容等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一級河川馬淵川</td> <td>・堤防、大堰、護岸等の河川施設の復旧(H24年度完了)(国) ・河口部の高潮堤防整備(H25.3完了)(国) ・馬淵川河川防災ステーション完成(H26.3完成)(国) ・八戸市水防センター完成(H26.3完成)(市)</td> </tr> <tr> <td>二級河川五戸川</td> <td>・河口部の堤防復旧(H24.3完了)(県) ・地震・高潮対策(H23年度～)(県) H26年度: 用地取得を実施 H27年度: 堤防嵩上げ工事、用地取得 H28年度: 堤防嵩上げ工事、用地取得</td> </tr> <tr> <td>二級河川新井田川</td> <td>・津波によって流された船の撤去(H23.6完了)(県) ・台風15号により損壊した護岸の復旧・改修(H25.3完了)(県) ・柳橋～塩入橋区間の水深測量調査を実施(H26年度)(県)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	内容等	市川海岸 ※五戸川河口北側	・五戸川河口北側の海岸堤防・離岸堤の災害復旧(H24.3完了)(県)	八戸港海岸(八太郎地区) ※五戸川河口南側	・五戸川河口南側の海岸堤防・陸間(こう)の整備(H25.9完成)(県)	市川地区保安林 (飛砂防備保安林)	・クロマツ苗木の植栽工、静砂工の実施(H28年度完了予定)(県)	項目	内容等	一級河川馬淵川	・堤防、大堰、護岸等の河川施設の復旧(H24年度完了)(国) ・河口部の高潮堤防整備(H25.3完了)(国) ・馬淵川河川防災ステーション完成(H26.3完成)(国) ・八戸市水防センター完成(H26.3完成)(市)	二級河川五戸川	・河口部の堤防復旧(H24.3完了)(県) ・地震・高潮対策(H23年度～)(県) H26年度: 用地取得を実施 H27年度: 堤防嵩上げ工事、用地取得 H28年度: 堤防嵩上げ工事、用地取得	二級河川新井田川	・津波によって流された船の撤去(H23.6完了)(県) ・台風15号により損壊した護岸の復旧・改修(H25.3完了)(県) ・柳橋～塩入橋区間の水深測量調査を実施(H26年度)(県)																							
項目	内容等																																							
市川海岸 ※五戸川河口北側	・五戸川河口北側の海岸堤防・離岸堤の災害復旧(H24.3完了)(県)																																							
八戸港海岸(八太郎地区) ※五戸川河口南側	・五戸川河口南側の海岸堤防・陸間(こう)の整備(H25.9完成)(県)																																							
市川地区保安林 (飛砂防備保安林)	・クロマツ苗木の植栽工、静砂工の実施(H28年度完了予定)(県)																																							
項目	内容等																																							
一級河川馬淵川	・堤防、大堰、護岸等の河川施設の復旧(H24年度完了)(国) ・河口部の高潮堤防整備(H25.3完了)(国) ・馬淵川河川防災ステーション完成(H26.3完成)(国) ・八戸市水防センター完成(H26.3完成)(市)																																							
二級河川五戸川	・河口部の堤防復旧(H24.3完了)(県) ・地震・高潮対策(H23年度～)(県) H26年度: 用地取得を実施 H27年度: 堤防嵩上げ工事、用地取得 H28年度: 堤防嵩上げ工事、用地取得																																							
二級河川新井田川	・津波によって流された船の撤去(H23.6完了)(県) ・台風15号により損壊した護岸の復旧・改修(H25.3完了)(県) ・柳橋～塩入橋区間の水深測量調査を実施(H26年度)(県)																																							

2. 施策を構成する主要事業（創造的復興プロジェクト事業等）

①海岸の津波対策の推進

No.01	◆市川海岸堤防・離岸堤の復旧	H23 完了
-------	----------------	--------

No.02	市川地区保安林の復旧	<事業主体> 県	事業費	H27 決算 H28 予算	一千円 一千円
【事業概要】	【実施状況】	【今後の予定】			
津波により倒木した市川地区の飛砂防備保安林の復旧	◎緊急雇用創出事業 ・津波により倒伏したクロマツ及び海岸漂着物の撤去 ・被害倒木（クロマツ）の伐採除去 ◎県海岸防災林造成事業（～H27 年度） ・クロマツ苗木の植栽 9.68ha ・静砂工の実施 31,753m	H28 年度 ◎県海岸防災林造成事業 ・クロマツ苗木の植栽 3.20ha ・静砂工の実施 1,900m ※H28 年度で事業終了予定			

No.03	◆市川地区の海岸堤防整備	H25 完了
-------	--------------	--------

②河川の洪水、津波・高潮対策の推進

No.04	◆一級河川馬淵川の堤防復旧	H25 完了
-------	---------------	--------

No.05	◆二級河川五戸川の堤防復旧	H23 完了
-------	---------------	--------

No.06	◆二級河川新井田川の原状復旧	H26 完了
-------	----------------	--------

No.07	◆水路の復旧	H23 完了
-------	--------	--------

No.08	◆一級河川馬淵川の河川改修	<事業主体> 国・市	事業費	H27 決算 H28 予算	一千円 一千円
【事業概要】	【実施状況】	【今後の予定】			
馬淵川の無堤区間における堤防の整備	◎河川改修事業（H27 年度） [国] 八幡地区改修事業（築堤完成） 一日市地区改修事業	H28 年度 一日市地区改修事業			

No.09	五戸川地震・高潮対策河川事業	<事業主体> 県	事業費	H27 決算	一千円	
				H28 予算	一千円	
【事業概要】 五戸川の地震・高潮対策の推進(既設堤防の嵩上げ、粘り強い構造への改良)		【実施状況】 計画延長 (1 工区) L=870m H27 年度 堤防工事、用地取得			【今後の予定】 H28 年度 堤防工事、用地取得	

3. 施策を取り巻く課題や論点

◎海岸の津波対策の強化 (河川の堤防等の早期復旧) ◎河川の津波・高潮対策の強化

4. 復興計画推進市民委員会意見

施策を取り巻く課題や論点に対する意見
その他自由意見

1. 施策情報

基本方向	3. 都市基盤の再建																																																																																													
施策名	3-(4) 道路・公園・下水道等の整備																																																																																													
施策の概要	<p>目指す姿 避難路となる道路網や避難先となる公園・緑地の整備、建物の耐震化等が進み、災害時における迅速かつ円滑な避難と安全が確保されている。</p> <p>市民アンケートにおける現状評価 【設問】避難道路や避難所の整備、避難所への物資の備蓄などにより、防災・減災対策の強化が図られている。 【点数】2.6</p> <p>施策の工程</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr style="background-color: #fff9c4;"> <th colspan="2">復旧期</th> <th colspan="3">再生期</th> <th colspan="5">創造期</th> </tr> <tr> <th>H23</th> <th>H24</th> <th>H25</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>H31</th> <th>H32</th> </tr> <tr> <td colspan="10">①道路の早期復旧と災害に強い道路網の整備</td> </tr> <tr> <td colspan="10">②公園・緑地の早期復旧と災害の緩衝空間として公園・緑地の整備</td> </tr> <tr> <td colspan="2">③し尿処理施設と下水道の早期復旧・整備</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">④公共施設の早期復旧・整備</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table> <p>参考指標の動向</p> <p>○復旧完了の衛生施設</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設名</th> <th>内容等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境クリーンセンター</td> <td>・第1、第2処理場の復旧 ・H24.9完了 ※復旧まで、東部終末処理場でし尿等受入</td> </tr> <tr> <td>八戸汚水中継ポンプ場</td> <td>・電気・機械設備等の復旧 ・H25.3完了</td> </tr> </tbody> </table> <p>○避難道路等の整備</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事業名</th> <th>内容等</th> <th>完了年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蓮沼八太郎山線道路改良事業</td> <td>・延長560mの拡幅 ・車道の拡幅</td> <td>H28年度 (予定)</td> </tr> <tr> <td>汐越線他階段整備事業</td> <td>・延長277.3mの拡幅 ・階段の拡幅</td> <td>H28年度</td> </tr> <tr> <td>橋向尻引線他道路改良事業 (橋向尻引線・向谷地堤下線)</td> <td>・延長2,472.8mの拡幅 ・車道の拡幅 ・歩道の整備(一部両側)</td> <td>H28年度 (予定)</td> </tr> <tr> <td>2号橋向線道路改良事業</td> <td>・延長592.1mの拡幅 ・車道の拡幅</td> <td>H28年度 (予定)</td> </tr> <tr> <td>市川後高屋敷線他道路改良事業 (市川後高屋敷線・市川後下揚線)</td> <td>・延長703.6mの拡幅 ・車道の拡幅</td> <td>H27年度</td> </tr> <tr> <td>市川工業団地通線道路改良事業</td> <td>・延長347.2mの拡幅 ・車道の拡幅</td> <td>H27年度</td> </tr> <tr> <td>橋向五戸線歩道拡幅事業(県)</td> <td>・延長300mの拡幅 ・歩道の拡幅</td> <td>H27年度</td> </tr> <tr> <td>八戸階上線湊橋歩道拡幅事業(県)</td> <td>・歩道の拡幅(橋長88m)</td> <td>H27年度</td> </tr> </tbody> </table>	復旧期		再生期			創造期					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	①道路の早期復旧と災害に強い道路網の整備										②公園・緑地の早期復旧と災害の緩衝空間として公園・緑地の整備										③し尿処理施設と下水道の早期復旧・整備										④公共施設の早期復旧・整備										施設名	内容等	環境クリーンセンター	・第1、第2処理場の復旧 ・H24.9完了 ※復旧まで、東部終末処理場でし尿等受入	八戸汚水中継ポンプ場	・電気・機械設備等の復旧 ・H25.3完了	事業名	内容等	完了年度	蓮沼八太郎山線道路改良事業	・延長560mの拡幅 ・車道の拡幅	H28年度 (予定)	汐越線他階段整備事業	・延長277.3mの拡幅 ・階段の拡幅	H28年度	橋向尻引線他道路改良事業 (橋向尻引線・向谷地堤下線)	・延長2,472.8mの拡幅 ・車道の拡幅 ・歩道の整備(一部両側)	H28年度 (予定)	2号橋向線道路改良事業	・延長592.1mの拡幅 ・車道の拡幅	H28年度 (予定)	市川後高屋敷線他道路改良事業 (市川後高屋敷線・市川後下揚線)	・延長703.6mの拡幅 ・車道の拡幅	H27年度	市川工業団地通線道路改良事業	・延長347.2mの拡幅 ・車道の拡幅	H27年度	橋向五戸線歩道拡幅事業(県)	・延長300mの拡幅 ・歩道の拡幅	H27年度	八戸階上線湊橋歩道拡幅事業(県)	・歩道の拡幅(橋長88m)	H27年度
復旧期		再生期			創造期																																																																																									
H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32																																																																																					
①道路の早期復旧と災害に強い道路網の整備																																																																																														
②公園・緑地の早期復旧と災害の緩衝空間として公園・緑地の整備																																																																																														
③し尿処理施設と下水道の早期復旧・整備																																																																																														
④公共施設の早期復旧・整備																																																																																														
施設名	内容等																																																																																													
環境クリーンセンター	・第1、第2処理場の復旧 ・H24.9完了 ※復旧まで、東部終末処理場でし尿等受入																																																																																													
八戸汚水中継ポンプ場	・電気・機械設備等の復旧 ・H25.3完了																																																																																													
事業名	内容等	完了年度																																																																																												
蓮沼八太郎山線道路改良事業	・延長560mの拡幅 ・車道の拡幅	H28年度 (予定)																																																																																												
汐越線他階段整備事業	・延長277.3mの拡幅 ・階段の拡幅	H28年度																																																																																												
橋向尻引線他道路改良事業 (橋向尻引線・向谷地堤下線)	・延長2,472.8mの拡幅 ・車道の拡幅 ・歩道の整備(一部両側)	H28年度 (予定)																																																																																												
2号橋向線道路改良事業	・延長592.1mの拡幅 ・車道の拡幅	H28年度 (予定)																																																																																												
市川後高屋敷線他道路改良事業 (市川後高屋敷線・市川後下揚線)	・延長703.6mの拡幅 ・車道の拡幅	H27年度																																																																																												
市川工業団地通線道路改良事業	・延長347.2mの拡幅 ・車道の拡幅	H27年度																																																																																												
橋向五戸線歩道拡幅事業(県)	・延長300mの拡幅 ・歩道の拡幅	H27年度																																																																																												
八戸階上線湊橋歩道拡幅事業(県)	・歩道の拡幅(橋長88m)	H27年度																																																																																												

2. 施策を構成する主要事業（創造的復興プロジェクト事業等）

①道路の早期復旧と災害に強い道路網の整備

No.01	交通安全施設(信号機、標識)の復旧	H23 完了
-------	-------------------	--------

No.02	県道の復旧	H23 完了
-------	-------	--------

No.03	市道の障害物除去	H23 完了
-------	----------	--------

No.04	市道の復旧	H23 完了
-------	-------	--------

No.05	避難道路等整備事業	<事業主体> 県・市	事業費
			H27 決算 925,537 千円 H28 決算 656,197 千円
【事業概要】	【実施状況】		【今後の予定】
安全に迅速な避難が出来るよう、津波被害を受けた市川地区、湊地区、河原木地区の避難路(道路・階段)の拡幅等整備を実施	H27 年度 (◎は H27 年度完了、○は H28 年度も継続) [市] ○蓮沼八太郎山線道路改良事業 (H24 年度～) (延長 560m、幅員 9.2m) ・道路改良工事 (L=360m) ○汐越線他階段整備事業 (H24 年度～) (延長 277.3m、幅員 4.0m) ・階段整備工事 (L=164.6m) ○橋向尻引線他道路改良事業 (H25 年度～) (延長 2,472.8m、幅員 9.5～11.0m) ・用地買収・工作物等移転補償、道路改良工事 (L=1,896.8m) ○2号橋向線道路改良事業 (H25 年度～) (延長 592.1m、幅員 6.0m) ・用地買収・工作物等移転補償、道路改良工事 (L=542.1m) ◎市川工業団地通線道路改良事業 (H25 年度～) (延長 347.2m、幅員 6.0m) ・道路改良工事 (L=347.2m) ◎市川後高屋敷線他道路改良事業 (H25 年度～) (延長 703.6m、幅員 6.0m) ・用地買収・工作物等移転補償、道路改良工事 (L=703.6m) ○市川町地内徒歩専用避難路整備事業 (H27 年度～) (延長 311m、幅員 2.5m) ・道路改良工事 (L=311m) ※H28 年度へ繰り越し [県] ◎橋向五戸線歩道拡幅事業 (H24 年度～) (延長 300m、幅員 12.5m) ・歩道拡幅工事 (L=300m) ◎八戸階上線湊橋歩道拡幅事業 (H24 年度～) (延長 88m、幅員 16.0m) ・歩道拡幅工事 (L=88m)	[市] ・蓮沼八太郎山線 用地買収・工作物等移転補償、道路改良工事 (L=200m) ・汐越線他 道路改良工事 (L=45.3m) ・橋向尻引線他 用地買収・工作物等移転補償、道路改良工事 (L=576m) ・2号橋向線 用地買収・工作物等移転補償、道路改良工事 (L=50m) ・市川町地内 道路改良工事 (L=311m)	

No.06	新大橋整備事業	<事業主体> 市	事業費	H27 決算 152,661 千円 H28 予算 860,100 千円
【事業概要】 架設から約 60 年 が経過している沼 館小田線（新大橋） 現橋梁の耐荷力、耐 震性能等を調査し た結果、長期間にわ たり、安定かつ安全 に供用するため、架 け替えを行う。		【実施状況】 全体延長 720m（うち橋長約 300m） H27 年度 ・新大橋詳細設計業務委託（H26→H27 繰越） ・新大橋地質調査業務委託（H26→H27 繰越） ・新大橋河原木跨線橋詳細設計業務委託（H26→ H27 繰越） ・新大橋詳細設計（道路）業務委託 ・新大橋地質調査（道路）業務委託 ・沼館小田線（新大橋）整備に伴う交通影響調査 検討業務委託		【今後の予定】 H28 年度 ・沼館小田線橋梁添架物移設補 償 ・沼館小田線用地測量物件調査 業務委託 ・沼館小田線営業補償調査業務 委託

②公園・緑地の早期復旧と災害の緩衝空間として公園・緑地の整備

No.07	公園の復旧	H23 完了
No.08	公園の災害廃棄物等処理	H23 完了
No.09	し尿処理施設の復旧	H24 完了
No.10	馬淵川流域下水道施設の復旧	H24 完了

③し尿処理施設と下水道の早期復旧・整備

No.11	し尿及び浄化槽汚泥受入・処理	H24 完了
No.12	下水道施設の復旧	H23 完了

④公共施設の早期復旧・整備

No.13	学校施設の復旧	H23 完了
No.14	清掃工場の復旧	H23 完了
No.15	消防施設の復旧	H23 完了
No.16	学校給食施設の復旧	H24 完了

No.17	保育所施設の復旧		H23 完了
No.18	社会教育施設の復旧		H23 完了
No.19	社会福祉施設の復旧		H23 完了
No.20	体育施設の復旧		H23 完了
No.21	文化施設の復旧		H23 完了
No.22	医療・保健施設の復旧		H23 完了
No.23	被災施設の解体撤去		H24 完了
No.24	斎場非常用発電設備更新工事		H24 完了
No.25	保育所複合化等推進事業		H25 完了
No.26	介護基盤緊急整備事業	<事業主体> 国・県等	事業費 H27 決算 21,081 千円 H28 予算 210,470 千円
	<p>【事業概要】 国や県の補助を受け、認知症グループホーム等の防災改修等に対する助成を実施</p>	<p>【実施状況】 地震や土砂災害等に対する防災対策を目的とした改修や、一定年数（10年程度）を経過して使用に堪えなくなった浴室及び食堂等の改修等を行う事業者に対し補助を行う。</p> <p>H22 年度 1 事業所(①) H23 年度 23 事業所(①②③) H24 年度 3 事業所(③) H25 年度 3 事業所(③) H26 年度 5 事業所(①) H27 年度 6 事業所(①②)</p> <p>① 介護基盤緊急整備特別対策事業 ② 既存施設の sprinkler 整備特別対策事業 ③ 認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業</p>	<p>【今後の予定】 ①H28 年度分 5 事業所 86,640 千円 H27 年度繰越分 1 事業所 123,830 千円</p>
No.27	東霊園無縁塔再整備事業		H25 完了

3. 施策を取り巻く課題や論点

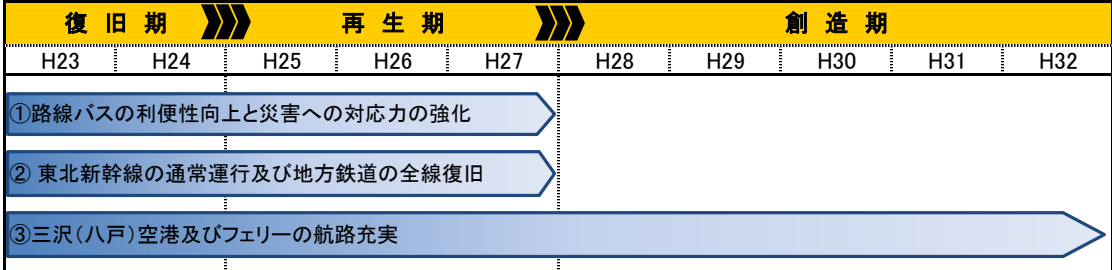
◎避難路等の整備の推進

4. 復興計画推進市民委員会意見

施策を取り巻く課題や論点に対する意見

その他自由意見

1. 施策情報

基本方向	3. 都市基盤の再建								
施策名	3 - (5) 公共交通の維持・確保								
施策の概要	<p>目指す姿 バスや鉄道等の公共交通の利便性の向上と災害時の対応力の強化が図られ、災害時における円滑な人の移動や物資の流通が確保されている。</p> <p>市民アンケートにおける現状評価 【設問】運行情報の提供や運賃の上限設定などにより、市内外における路線バスの利便性が高まっている。 【点数】2.9</p> <p>施策の工程</p>  <p>参考指標の動向</p> <p>○市営バスの災害への対応力の強化</p> <table border="1" data-bbox="438 1160 1388 1585"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>20kl → 50kl (H24.10使用開始)</td> </tr> <tr> <td>車載無線機</td> <td>全車両124台に設置 (H24.10使用開始)</td> </tr> <tr> <td>標高(海拔)表示</td> <td>津波浸水想定区域内のバス停238か所に表示 (H25.2末表示完了)</td> </tr> </tbody> </table>	項目	内容	燃料タンク	20kl → 50kl (H24.10使用開始)	車載無線機	全車両124台に設置 (H24.10使用開始)	標高(海拔)表示	津波浸水想定区域内のバス停238か所に表示 (H25.2末表示完了)
項目	内容								
燃料タンク	20kl → 50kl (H24.10使用開始)								
車載無線機	全車両124台に設置 (H24.10使用開始)								
標高(海拔)表示	津波浸水想定区域内のバス停238か所に表示 (H25.2末表示完了)								

2. 施策を構成する主要事業（創造的復興プロジェクト事業等）

①路線バスの利便性向上と災害への対応力の強化

No.01	市営バス・民間バス事業者通常運行	H23 完了
-------	------------------	--------

No.02	【復興】日本モビリティマネジメント会議の誘致・開催	H23 完了
-------	---------------------------	--------

No.03	★地域公共交通活性化・再生総合事業	<事業主体> 市・民	事業費	H27 決算 49,508 千円 H28 予算 59,659 千円
<p>【事業概要】 震災時の教訓を踏まえ、地域公共交通の利便性や持続性を向上させる施策の継続的実施及び更なる地域公共交通の活性化を図るため、交通ターミナル強化等のリーディングプロジェクトの実施</p>	<p>【実施状況】 H26.3 に策定した第 2 次八戸市地域公共交通総合連携計画（H26～30）に基づき、使いやすい地域公共交通ネットワークの確保と交通拠点の機能強化、路線の維持と活性化を図るための事業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種企画乗車券等を一冊にまとめた小冊子の作成・配布 バスルートカラーをデザインしたバス停の改良整備 交通ターミナルに公共交通アテンダントを配置し、乗継案内や車内アナウンスを実施するとともに、各種のモビリティマネジメントを実施 交通ターミナルへの公共交通路線図・情報ツールラックを作成・設置 バスマップはちのへ・市内幹線軸の等間隔運行・共同運行路線の共通時刻表を作成・配布 			<p>【今後の予定】 H28.3 に策定した八戸市地域公共交通網形成計画（H28～34）に基づき、各種事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 効果的な利用促進のため、モビリティマネジメントの推進 バス運転士不足解消を目指したバス運転士確保支援 新たな枠組みにおける低床車両や IC カード導入の検討 交通ターミナルに公共交通アテンダントを配置し、乗継案内や車内アナウンスを実施するとともに、各種のモビリティマネジメントを実施 バスマップはちのへ・市内幹線軸の等間隔運行・共同運行路線の共通時刻表・チラシ・リーフレットを作成・配布

No.04	★八戸圏域公共交通計画推進事業	<事業主体> 圏域市町村	事業費 H27 決算 43,423 千円 H28 予算 7,837 千円
【事業概要】 震災復興の観点から、圏域住民の定住と交流を促進するため、路線バス上限運賃政策をはじめとする各リーディングプロジェクトの実施	【実施状況】 H26.3 に策定した第2次八戸圏域公共交通計画(H26～30)に基づき、路線バス上限運賃政策の継続実施や各種モビリティマネジメントなどのリーディングプロジェクトを実施 ◎広域路線バス上限運賃政策の継続実施 ・上限運賃政策の継続実施 ・広域路線バスの維持・支援の仕組みづくりの検討 ・新運賃制度の検討 ◎圏域の一体的な公共交通マネジメントの展開 ・路線バスパックの利用促進(五戸町、階上町) ・路線バスパックの企画商品化(三戸町) ・路線バスパック案の検討(南部町、おいらせ町)	【今後の予定】 事業継続実施 ◎広域路線バス上限運賃政策の継続実施 ・上限運賃政策の継続実施 ◎広域移動を支援する環境整備 ・低床車両、ICカードの導入検討 ◎圏域の一体的な公共交通マネジメントの展開 ・バスパックを活用した路線バスの利用促進と住民の交流促進	
No.05	災害時における公共交通の安定供給に関する検討(再掲)	<事業主体> 市	事業費 H27 決算 0 千円 H28 予算 0 千円
【事業概要】 バス等交通事業者、警察、国、県などの関係機関との連携による災害時を見据えた公共交通対策の検討	【実施状況】 「災害時公共交通対策検討分科会」の設置(H24.5)(バス事業者、タクシー事業者、鉄道事業者、道路管理者、警察、学識経験者、一般市民等により構成) H24.5～H25.3 災害時公共交通対策検討分科会開催(10回) H24.5～H25.3 地域公共交通会議開催(4回) ・「八戸市災害時公共交通行動指針」策定(H25.3) ・八戸市地域防災計画の修正(H26.1)に合わせ、改訂後の同計画に行動指針の内容を反映	【今後の予定】 策定した行動指針に基づき、各事業者が大規模災害に備える。 ・行動指針に沿って情報伝達訓練を実施	

No.06	市営バスの災害への対応力の強化	H24 完了
-------	-----------------	--------

②東北新幹線の通常運行及び地方鉄道の早期全線復旧

No.07	JR八戸線運転再開	H23 完了
-------	-----------	--------

No.08	青い森鉄道全線運転再開	H23 完了
-------	-------------	--------

No.09	東北新幹線通常運転再開	H23 完了
-------	-------------	--------

No.10	◆JR八戸線の早期完全復旧	H23 完了
-------	---------------	--------

③三沢（八戸）空港及びフェリーの航路充実

No.11	フェリー航路の再開(再掲)	H23 完了
-------	---------------	--------

3. 施策を取り巻く課題や論点

<ul style="list-style-type: none"> ◎災害時を見据えた交通対策の充実 ◎持続可能な交通体系の確立

4. 復興計画推進市民委員会意見

施策を取り巻く課題や論点に対する意見
Empty space for comments
その他自由意見
Empty space for other free comments
