

建設協議会協議事項

〔 日時 令和4年1月20日(木)
午前9時30分
場所 第四委員会室 〕

○ 所管事項の報告について

- 1 令和3年度 国補正予算成立に伴う番町線電線共同溝本体工事について
- 2 令和3年度 国補正予算成立に伴う新大橋整備事業・護床工工事等について

令和3年度 国補正予算成立に伴う 番町線電線共同溝本体工事について

1. 1月補正予算とする主な理由

電線共同溝本体工事を実施する市道番町線は、市中心街に位置し、交通量が多い2車線道路であることから、工事の交通規制に伴う影響を少なくするため、施工は工事区間内を細分化して進めることとしており、早期に工事着工することで、工期は長期間に及ぶものの、令和4年度内での完成が見込まれるため

※「電線共同溝本体」とは、地下に複数の電線ケーブルを収容するための施設

2. 補正額

50,000千円

工事費（電線共同溝本体工事 L=220.0m）

50,000千円

番町線無電柱化事業について


<位置図>

<事業概要>

○番町線

・延長 L=220.0m、幅員 W=8.0m

<標準断面図>

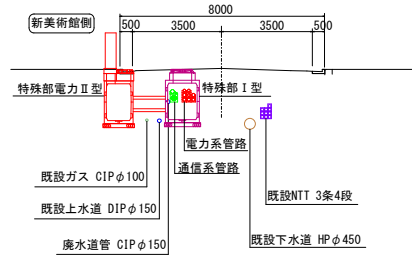

<事業経緯>

R元～2年度

→電線共同溝詳細設計、用地物件調査

R3年度

→電線共同溝本体工事、用地物件補償

R4年度(予定)

→電線共同溝本体工事

R5～6年度(予定)

→連系設備補償


→ケーブル入線・抜柱

→舗装工事


<現況写真>

【写真①】

【写真②】



<平面図>

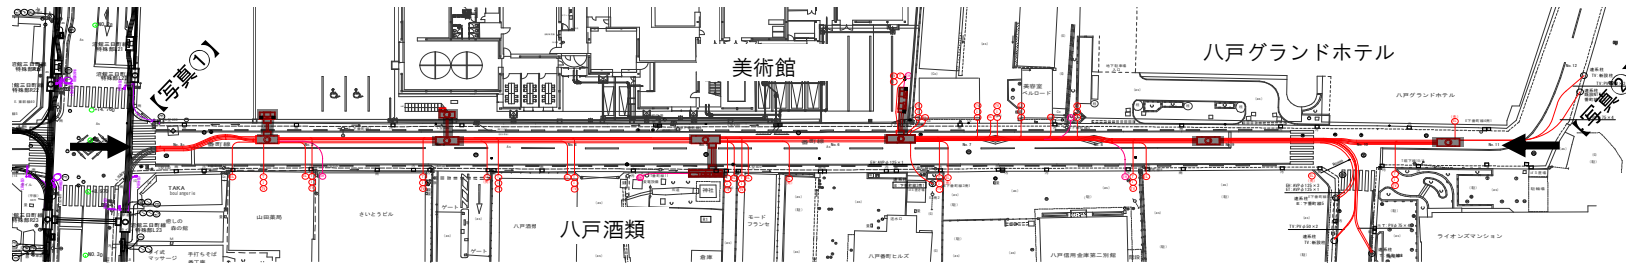


【凡例】
赤: 施工箇所
黒: 施工済

<工事発注スケジュール>

	R4.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R5.1	2	3	4	5	
3月補正 (R4.4発注)				●	起案～入札			●	準備			●	工事					
1月補正 (R4.1発注)	●	起案～入札			●	準備			●	工事								

【電線共同溝整備イメージ】

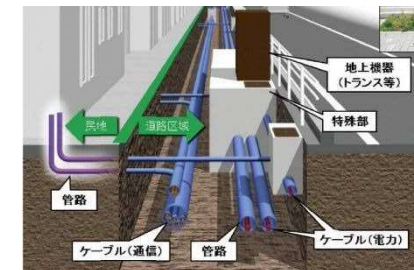

令和3年度 国補正予算成立に伴う 新大橋整備事業・護床工工事等について

1. 1月補正予算とする主な理由

対象の護床工工事は、新設橋の一部橋脚まわりの洗掘防止のためのものであり、11月から翌年5月までの非出水期に限り、国から工事が承認されており、早期着手することで、効果的に事業の進捗を図ることが出来るため

2. 補正額

90,000千円

うち、工事費（P1、P4橋脚まわりの護床ブロック設置） 80,000千円

うち、補償費（架替工事に伴う電線切替等の補償） 10,000千円


新大橋一般図

側面図

青: 令和2年度完成
 緑: 令和3年度施工中
 赤: 令和3年度国補正施工箇所
 水: 令和4年度以降施工予定

沼館地区
 ← 右岸側

八太郎地区
 → 左岸側

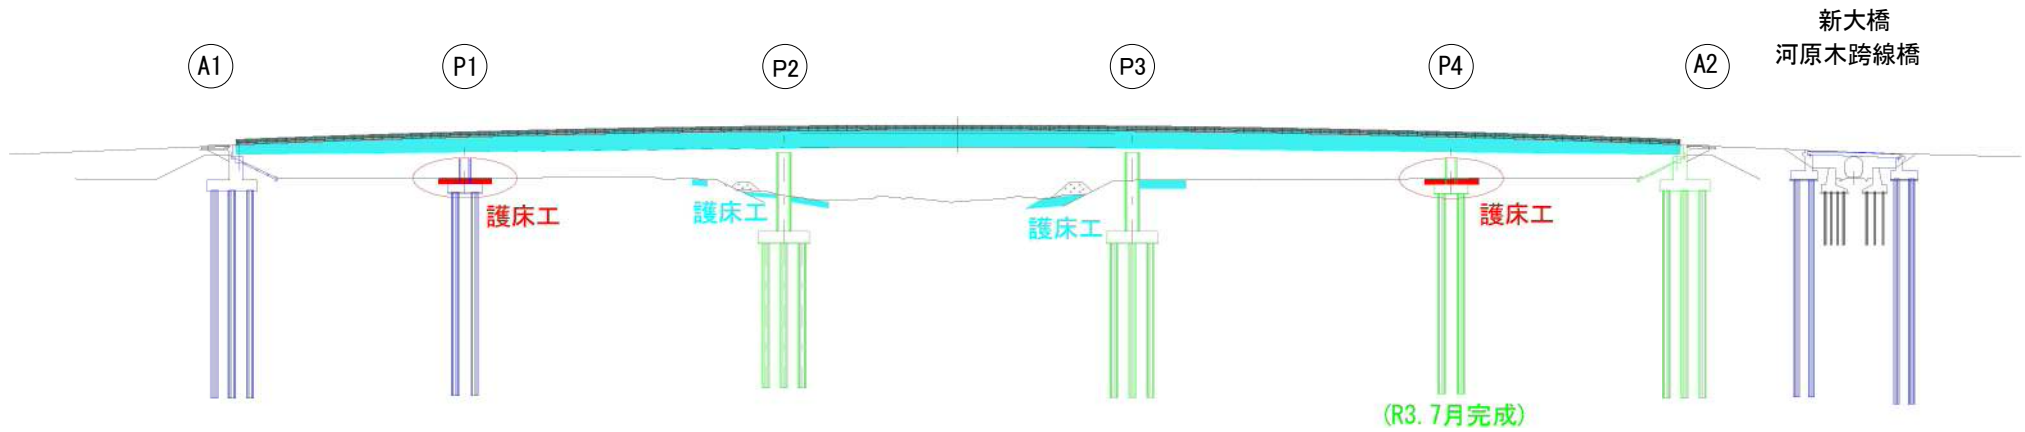

工事発注スケジュール

P1・P4 護床工工事	令和3年度			令和4年度												令和5年度	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
	非出水期(工事可)					出水期(工事不可)						非出水期(工事可)					
3月補正 (R4.4月発注)				起案～入札～契約					準備			工事(4ヶ月間、同一現場内の上部工架設)			工事と重複		
													【別途発注】上部工架設工事予定				
1月補正 (R4.1月発注)	起案～入札～契約		準備	工事									工事(2ヶ月間、同一現場内の上部工架設)		工事と重複		
													【別途発注】上部工架設工事予定				
